


鉄拐山トンネル

- 工事名称 / 鉄拐山トンネル災害防除工事
- 発注者 / 神戸市役所
- 工事場所 / 神戸市須磨区西須磨町～垂水区朝谷町
- 工事延長 / 156.0m (パネル209枚)
- 工事期間 / 平成11年1月～3月
- 工事内容 / 日通行量2万台のトンネルにおいて、夜間片側通行規制を行いながらスピンアームを用いて架設した。覆工コンクリートの背面が空洞化した箇所では、当該箇所をエアモルタルで裏込め注入を行いながらPCL版の裏込め注入も行った。

● 施工前状況

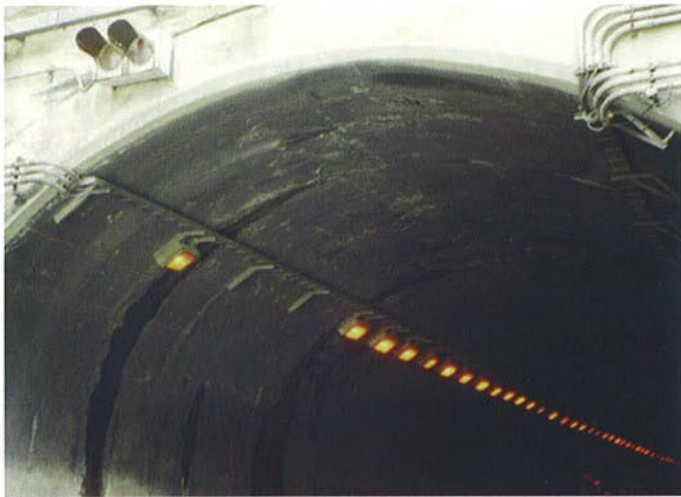

● PCL版据付状況



● PCL版据付状況



● 標準断面図

