


阿川トンネル

- 工事名称 / 石井神山線 道路維持修繕工事
- 発注者 / 徳島県徳島土木事務所
- 工事場所 / 徳島県名西郡神山町阿野宇屋那瀬 地内
- 工事延長 / 延長51.0m (パネル数=71枚)
- 工事期間 / 平成15年6月～平成17年10月
- 工事内容 / トンネル覆工の老朽化による、クラック・漏水が発生し2分割してPCL版にて覆工の補修を行った。
据付には、スピナーームを使用した。


● PCL版据付状況-1

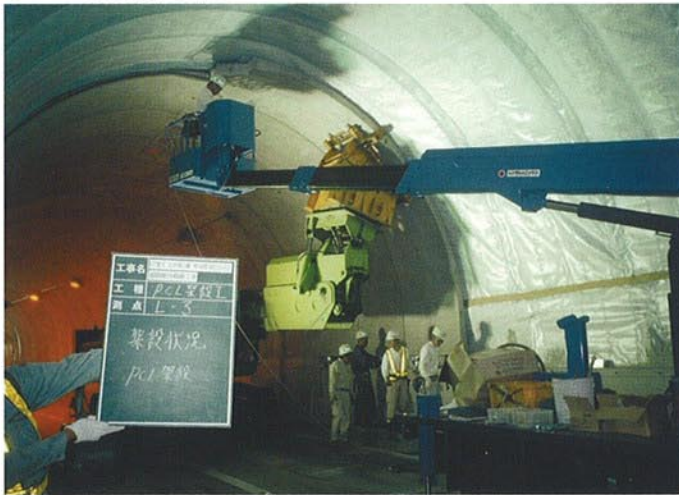

● PCL版据付状況-2



● 据付完了状況

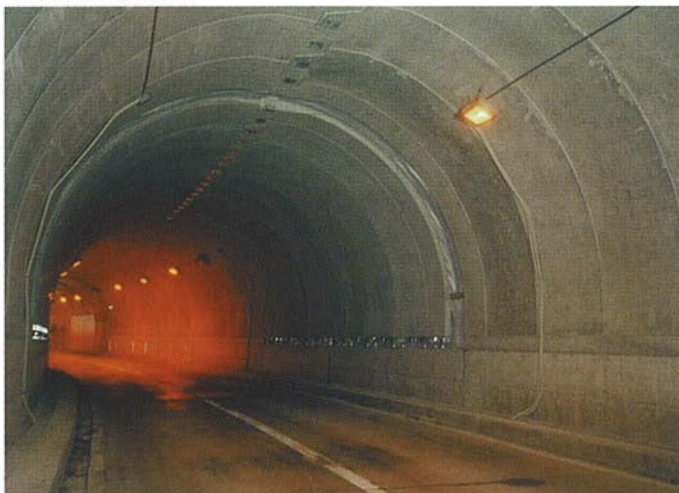

● 標準断面図

