

## 金精トンネル

- 工事名称 / 道路災害防除工事
- 発注者 / 栃木県日光土木工事事務所
- 工事場所 / 栃木県日光市湯元地先（金精峠）
- 工事延長 / 27m（パネル数=37枚）
- 工事期間 / 平成17年11月～12月
- 工事内容 / 老朽化したトンネルアーチ部の補強、ひび割れ補修を目的としトンネルアーチ部分を2分割したPCL版にて補強した。  
供用トンネルの片側通行帯確保が可能なPCL工法が採用された。  
（据付には、PCL版架設用専用重機スピナーームを用いた。）


● 施工前状況



● PCL版据付状況



● 据付完了状況

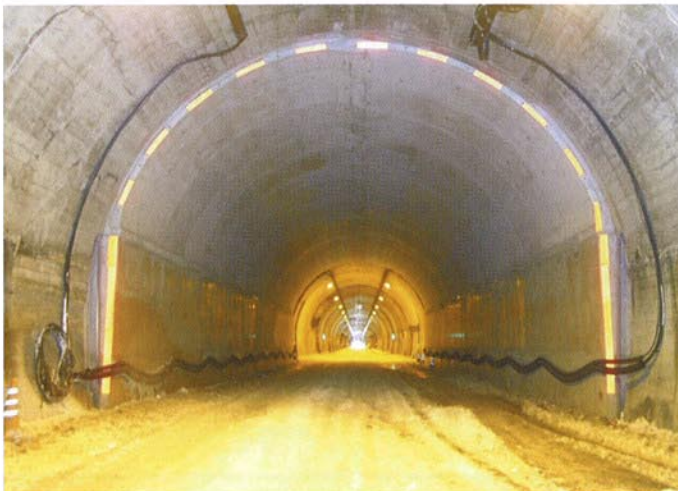

● 標準断面図

