132

荒川隧道

- 工事名称／荒川トンネル補修工事(2 工区)
- 発 注 者／屋久島町役場
- 工事場所／荒川線 鹿児島県屋久島町安房地内
- 工事延長／13.3 m(パネル数＝17 枚)
- 施工期間／令和 3 年 3 月
- 工事内容／当工事箇所は、素掘りの隧道で坑口のみ覆工されていた。
  露岩部からの湧水と脆弱部の剥離があり、通行車両へ落石の危険があった。
  観光道路であることから早期の補修対策が求められた為、PCL 工法が採用された。

●着工前状況

●ＰＣＬ据付状況

●据付完成完了
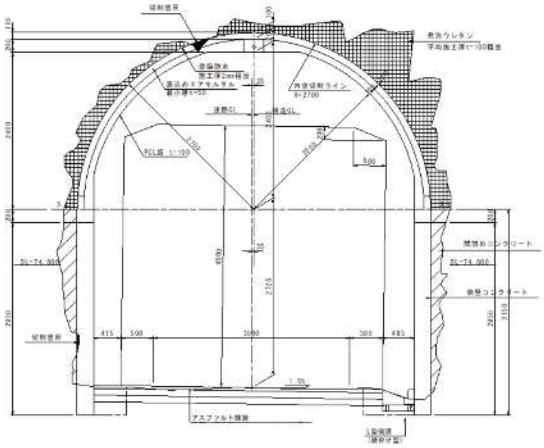
●標準断面図
