137

鉄拐山トンネル

- 工事名称／鉄拐山トンネル補修工事
- 発 注 者 ／神戸市
- 工事場所／兵庫県神戸市須磨区
- 工事延長／3.14 m×2 箇所＝6.28 m（パネル数＝12 枚）
- 施工期間／令和 4 年 1 月
- 工事内容／トンネル坑口部の老朽化による補強。PCL 版を捨て型枠使用とし、背面にコンクリートを打設して補修を行った。
  据付にはスピンアーム方式を採用した。

●据付前状況（標準断面）

●ＰＣＬ据付状況

●据付完成状況
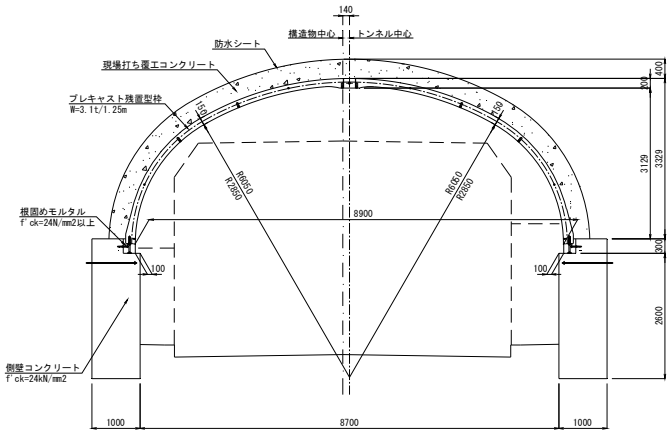
●断面図
